

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre_19

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa: Nayarit

Clave Inst 911: 18MSU0019M

Planeación

Nombre: Aldo Asunción Zea Verdín
Cargo: Director de la Unidad de Desarrollo Institucional
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
Correo electrónico: aldozea.uan@gmail.com

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
Cargo: Director de Obra Universitaria
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad | Nombre del proyecto | Tipo de proyecto | | | | | Monto autorizado | Monto ejercido | Remanente | Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹ | | | Acciones que sustentan el avance ² | Acciones por realizar | % de avance | Fechas ³ | | Observaciones | ¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas) | Si ya fue inaugurada | | Cuenta con Actas | | |
|-----------|---|--------------------|--------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---|----------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------|---------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| | | Obras de comunidad | Equipamiento | Adaptaciones y mejoras | Mantenimiento | Proyecto sustentable | | | | Espacio/equipo | Cantidad | Metros cuadrados | | | | Inicio | Término | | | ¿Cuenta con fotos del evento? | ¿Quién y cuándo inauguró? | Entrega- Recepción (Acta finiquito) | Acta Administrativa de Entrega- Recepción | Monto de Acta Administrativa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura | x | | | | | \$ 10,252,240.00 | \$ 10,042,136.54 | \$ 210,103.46 | Aulas | 11 | 722.00 | Se han pagado 6 estimaciones y 2 estimaciones extraordinarias. Esta por concluirse la construcción. | El recurso se ejecutó al 100%, el avance físico, están en 80%, por lo que esta cercana la conclusión de la obra, se espera para el siguiente informe mensual tener el acta de entrega recepción. | GLOBAL DEL PROYECTO | | 90% | 15/07/19 | 31/12/19 | | | | | |
| | | | | | | | | | Sanitarios | 2 | 54.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Áreas comunes | 3 | 95.18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Otros | 2 | 200.24 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 18 | 1071.42 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Otros | 5 | | GLOBAL DEL PROYECTO | | 100% | 30/09/19 | 29/10/19 | | | | | | | | |
| 3 | Red de Bebederos en el Campus Central | x | | | | \$ 484,622.54 | \$ 400,016.98 | \$ 84,605.56 | | | | Se concluyó la obra. | Entrega del acta y cierre del proyecto | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 6 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | \$10,736,862.54 | \$10,442,153.52 | \$294,709.02 | | | | | | | | | | | | | | | |

MA

J.C. Jorge Ignacio Peña González

Ernesto Navarrete Méndez

- 1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto de podrán anexas tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
diciembre_2019
FECHA DE CORTE: 31/12/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


90%

PROYECTO


2

Nombre de la obra: **Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

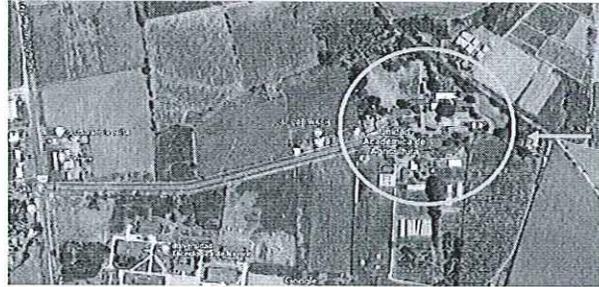

ÁREA DE ATENCIÓN

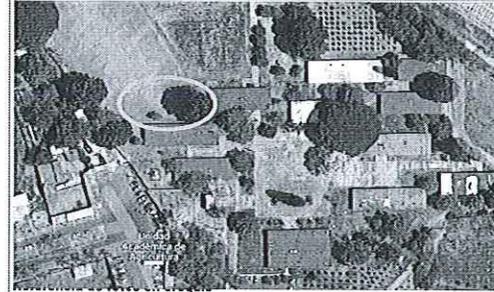

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

PUERTO VALLARTA-TEPIC COMPOSTELA, KM 9,
63780, XALISCO, NAYARIT.

FOTOS



F1: Fachada principal




F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

La construcción se encuentra en la recta final, se espera que para el siguiente mes se concluya.



F3: Fachada posterior

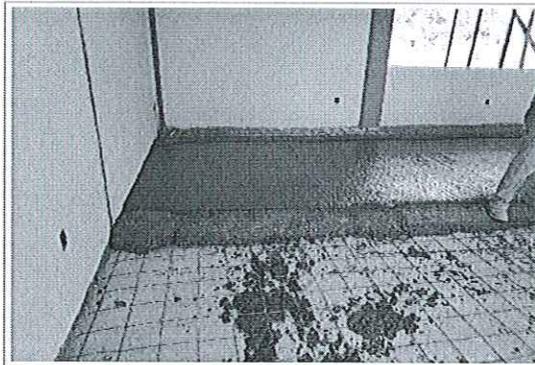

F4: Entrada



F5: Interior de aula

KA
[Signature]
M. C. Jorge Ignacio Peña González

[Signature]
Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre 2019

FECHA DE CORTE: 31/12/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100%

3 Nombre de la obra: **Red de Bebederos en el Campus Central**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

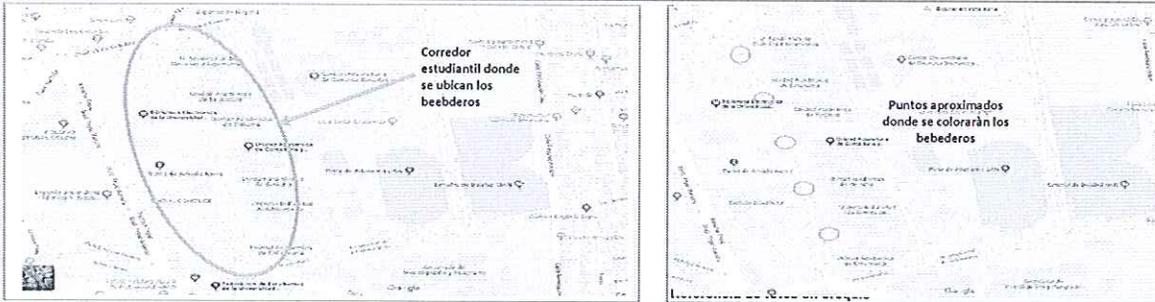


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000

FOTOS

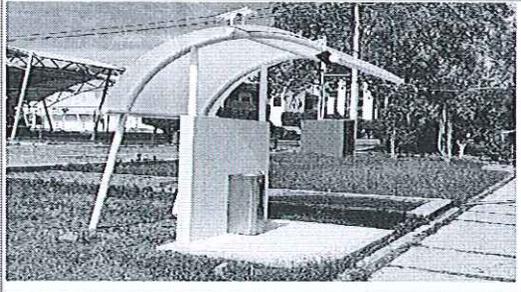


F1: Preparación de espacio para colocación de bebedero

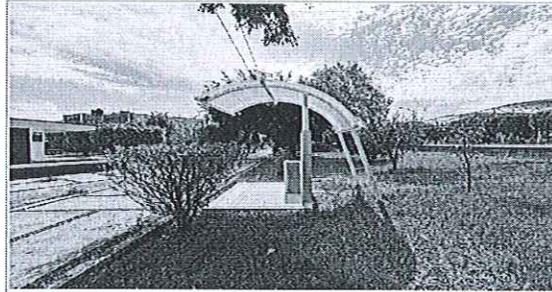

F2: Preparación de espacio para colocación de bebedero

Comentarios de los trabajos realizados:

La obra se concluyó al 100%.

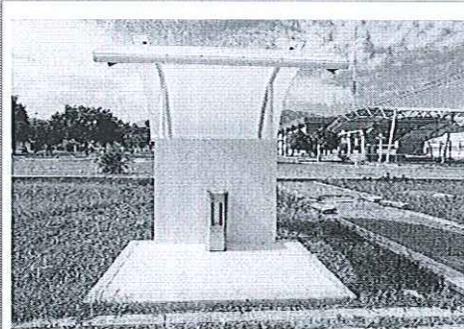

F3: Preparación de espacio para colocación de bebedero



F4: Preparación de espacio para colocación de bebedero



F5: Preparación de espacio para colocación de bebedero

IA

M. C. Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
