



UAN/SPP/05-305/2021  
Tepic, Nayarit; 08 de octubre de 2021.

**ASUNTO:** Remisión del  
3er. informe trimestral, FAM 2021.

**Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz**  
**Director de Fortalecimiento Institucional**  
**PRESENTE**

*Done*

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 3er. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021; correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de septiembre del 2021.

Se envía anexo el formato impreso debidamente firmando. De igual manera, se realiza la entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones: [rocioc@nube.sep.gob.mx](mailto:rocioc@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx), [jcarlosv@nube.sep.gob.mx](mailto:jcarlosv@nube.sep.gob.mx).

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**

**M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy**  
**Secretario de Planeación y Programación**



C. Exp. Expediente



2021

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3ro.

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre Universidad Autónoma de Nayarit  
 Entidad federativa: Nayarit  
 Clave Inst 911: 18MSU0019M



Planeación  
 Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy  
 Cargo: Secretaria de Planeación y Programación  
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786  
 Correo electrónico: erik.jimenez@uan.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento  
 Nombre: Ernesto Navarrete Méndez  
 Cargo: Director de Obra Universitaria  
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638  
 Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Dono de comunidad	Equipamiento	Adaptaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/ equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas	x				\$ 9,200,000.00	\$ -	\$ 9,200,000.00	Auditorio	1	124.48	Se planea realizar el proceso de licitación y comprometer el recurso durante el último trimestre del 2021.	0%	GLOBAL DEL PROYECTO										
									Laboratorios	1	133.68			Inicio	Termino									
									Áreas comunes	1	73.60													
									Sanitarios	2	48.00													
<b>TOTAL</b>									<b>5</b>	<b>379.76</b>														
2	Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería					\$ 6,464,819.45	\$ 6,349,823.30	\$ 114,996.15	Aulas	4	192.00	Se llevó a cabo la licitación y se dio fallo. Se firmó contrato UAN-DRM-OP-003-2021	0%	GLOBAL DEL PROYECTO		04/10/21								
									Áreas comunes	1	70.00			Inicio	Termino									
									Sanitarios	2	48.00													
									<b>TOTAL</b>												<b>7</b>	<b>310.00</b>		
						<b>\$15,664,819.45</b>	<b>\$6,349,823.30</b>	<b>\$9,314,996.15</b>																

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto, se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.  
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismo que se veran reflejados en el reporte fotográfico.  
 3 Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3ro.

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0%

1 Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

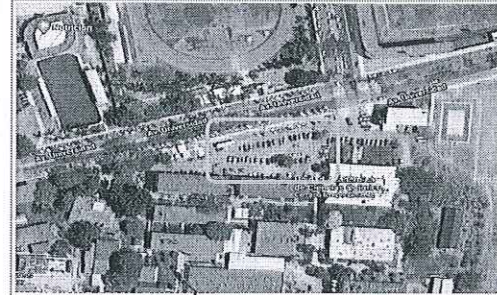


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3ro.

FECHA DE CORTE: 30/09/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0%

2 Nombre de la obra: Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

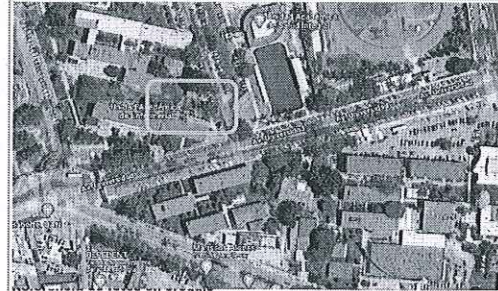


ÁREA DE ATENCIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIIC, NAYARIT.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: Interior


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

*[Firma]*  
M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

*[Firma]*  
Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
