



UAN/SPP/05-001/2022
Tepic, Nayarit; 07 de enero de 2022.

ASUNTO: Remisión del
4to. informe trimestral, FAM 2021.

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 4to. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2021; correspondiente al periodo 01 de octubre al 31 de diciembre del 2021.

Se envía anexo el formato impreso debidamente firmando. De igual manera, se realiza la entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, icarlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación y Programación



~~C.c.p. Expediente~~



2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

4to.

FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
 Entidad federativa: Nayarit
 Clave Inst 911: 18MSU0019M

Planeación

Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy
 Cargo: Secretaria de Planeación y Programación
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
 Correo electrónico: enik.jimenez@uan.mx

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
 Cargo: Director de Obra Universitaria
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
 Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Romanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de conservación	Equipamiento	Adquisición y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Termino	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Act Administrativ	
																							¿Cuenta con fotos del evento?
1	Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas	x				\$ 9,200,000.00	\$ 5,185,565.23	\$ 4,014,434.77	Auditorio	1	124.48	Se realizó el pago del anticipo correspondiente al 30% del monto contratado y se pagó la estimación 1. Se suman a lo anterior los pagos de las estimaciones 2 y 3.	Continuar con la ejecución de los recursos y con los avances de obra hasta su conclusión, durante el 1er. Trimestre del 2022.	40%	03/11/21	Se firmó contrato no. UAN-DOU-OP-040-2021. Por el monto de: \$ 8,838,498.80							
		Laboratorios	1	133.68																			
		Áreas comunes	1	73.60																			
		Sanitarios	2	48.00																			
		TOTAL	5	379.76																			
2	Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería	x				\$ 6,464,819.45	\$ 3,373,806.49	\$ 3,091,012.96	Aulas	4	192.00	Se realizó el pago de la estimación 1. Nota: se corrige el no. de contrato, favor de hacer los cambios en sus notas.	Continuar con la ejecución de los recursos y con los avances de obra hasta su conclusión, durante el 1er. Trimestre del 2022.	20%	04/10/21	Se firmó contrato no. UAN-DOU-OP-033-2021. Por el monto de: \$ 6,349,823.30. En el informe pasado este monto se indicó como monto ejercido, favor de tomar nota para corrección. Así mismo el número de contrato también debe corregirse.							
		Áreas comunes	1	70.00																			
		Sanitarios	2	48.00																			
		TOTAL	7	310.00																			
						\$15,664,819.45	\$8,559,371.72	\$7,105,447.73															

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

4to.

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avances

40%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



ÁREA DE ATENCIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT.

FOTOS



F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Cimentación y estructura de la planta baja, en la imagen se aprecia la cimbra de la losa correspondiente a la planta baja



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Havarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado
4to.
FECHA DE CORTE: 31/12/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

20%

PROYECTO 2 Nombre de la obra: **Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT.

FOTOS

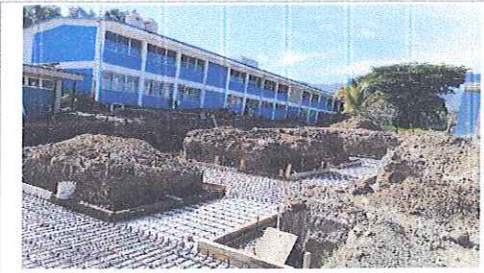


F1: Fachada principal



F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:
Plantilla de concreto, armado de cimentación y columnas.

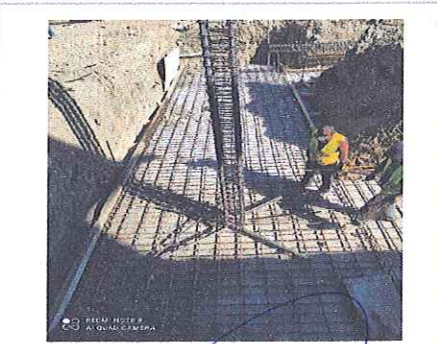

F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

M.C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Arq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestafa, se podrán copiar tantas pestafas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
