



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/483/2022
Tepic, Nayarit; 07 de octubre de 2022.

ASUNTO: Remisión del
3er. informe trimestral, FAM 2022.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional, DGESUI.
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer entrega del 3er. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2022; correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de septiembre del 2022.

Se envía anexo el formato debidamente firmando y se realiza la entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx.

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Expediente

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

2022

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3ro.

FECHA DE GORTE: 30/09/2022

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Nayarit**
 Entidad federativa: Nayarit
 Clave Inst 911: 18MSU0019M

RESPONSABLES

Planeación
 Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy
 Cargo: Secretaria de Planeación y Programación
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
 Correo electrónico: erik.jimenez@uan.mx

Obras y Mantenimiento
 Nombre: Stephany Quezada González
 Cargo: Directora de Obra Universitaria
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
 Correo electrónico: stepy33@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas			
		Obras de continuidad	Equipamiento	Adornamientos y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustanciable	Espacio/ equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Edificio de aulas (segunda etapa), Unidad Académica de Enfermería	x				\$ 8,701,602.00	\$ 8,583,721.51	\$ 117,880.49	Aulas	3	163.00	En el mes de agosto 2022 se llevó a cabo un proceso de licitación no. UAN-SPP- DOL-IR-OPE-001-2022 para esta obra, mismo que se declaró desierto. Para el mes de septiembre se realizó nuevamente el proceso (licitación no. UAN-SPP-DOL-IR-OPE-004-2022), misma en la que ya se tuvo un contratista que cumplió con los criterios del Comité de Obras Públicas de la UAN. Para el mes de octubre la Institución contará con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra (prioridad 1).	0%	27/09/22	05/12/22									
			Otros	2	812.00																			
			Sanitarios	2	54.00																			
			Cubículos	3	54.00																			
			TOTAL	10	1083.00																			
2	Edificio para laboratorios (segunda etapa) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas	x				\$ 4,130,022.00	\$ -	\$ 4,130,022.00	Áreas comunes	1	25.00	Se llevará a cabo el proceso de licitación para el mes de noviembre 2022.	0%											
			Sanitarios	1	54.00																			
			Laboratorios	4	272.00																			
			Otros	1	486.00																			
			TOTAL	7	837.00																			
						\$12,831,624.00	\$8,583,721.51	\$4,247,802.49																

P.A.
 Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora

[Firma]
 Arq. Stephany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
 2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos; dd, mm y aa.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3ro.

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avances

0%

PRIORIDAD **1** Nombre de la obra: **Edificio de aulas (segunda etapa), Unidad Académica de Enfermería**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




ÁREA DE ATENCIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT.
Unidad Académica de Enfermería

FOTOS

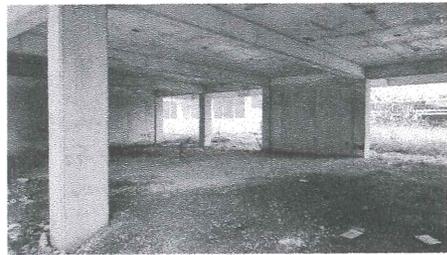


F1: Fachada principal



F2: lateral



F3: Fachada posterior

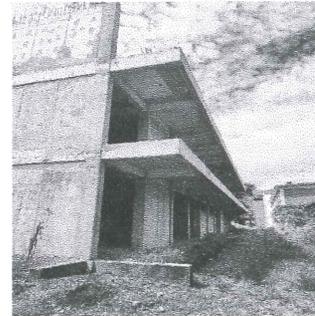

F4: Entrada

Comentarios de los trabajos realizados:

Primera etapa concluida al 100%. A partir de estos avances se inicia la segunda etapa con FAM 2022.



F5: Interior de aula

Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora

Arq. Stephany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico en todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre reportado

3ro.

FECHA DE CORTE: 30/09/2022

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra: **Edificio para laboratorios (segunda etapa) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P.
6300, TEPIC, NAYARIT.
Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

FOTOS




F1: Fachada principal




F2: lateral


Comentarios de los trabajos realizados:



F3: Fachada posterior



F4: Entrada



F5: Interior de aula

Dra. Norma Liliana Galván Misza, Rectora

Arq. Stephany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
