



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

UAN/SPPI/214/2024  
Tepic, Nayarit; 10 de abril de 2024  
**ASUNTO:** Remisión del  
1er. informe trimestral  
2024, FAM 2024.

**DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito hacer entrega del 1er. informe trimestral 2024, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024; correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2024.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

[cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx), y [dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx](mailto:dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx).

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”**

**M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY**  
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo

**Secretaría  
de Planeación,  
Programación  
e Infraestructura**

**Torre de Rectoría 2do. Piso**  
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"  
C.P. 63000 Tepic, Nayarit  
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786



Ministerio de Finanzas y Comercio Exterior  
Dirección General de Contabilidad y Estadística

Código	Descripción	Tipo de Cuenta	Saldo Inicial		Saldo Final		Saldo Final	Observaciones	Fecha
			Debe	Haber	Debe	Haber			
1	Saldo de apertura								
2	Ingresos								
3	Egresos								
4	Saldo de cierre								
TOTAL			10	701.62	10	701.62			
Cuentas de Ingresos			4	450	4	450			
Cuentas de Egresos			6	251.62	6	251.62			
Ajustes			1	600	1	600			
TOTAL			11	1301.62	11	1301.62			
Ajustes			8	912.00	8	912.00			
Salarios			1	600	1	600			
Laboratorios			1	400	1	400			
Fletes			3	271.68	3	271.68			
Ajustes adicionales			1	200	1	200			
Administración			5	392.27	5	392.27			
Cuentas de Ingresos			2	175.68	2	175.68			
Cuentas de Egresos			1	600	1	600			
Ajustes			6	713.84	6	713.84			
Otros			4	397.42	4	397.42			
Ajustes			1	348.00	1	348.00			
TOTAL			23	5816.86	23	5816.86			
Ajustes			10	920.00	10	920.00			
Salarios			1	140.00	1	140.00			
Laboratorios			29	302.00	29	302.00			
Fletes			1	91.00	1	91.00			
Cuentas de Ingresos			1	51.00	1	51.00			
Cuentas de Egresos			11	140.00	11	140.00			
Ajustes			6	348.00	6	348.00			
Otros			2	100.00	2	100.00			
TOTAL			60	10810.00	60	10810.00			
Ajustes			8	420.35	8	420.35			
Cuentas de Ingresos			1	91.25	1	91.25			
Laboratorios			3	340.20	3	340.20			
Salarios			2	83.2	2	83.2			
Otros			3	41.00	3	41.00			
TOTAL			2	215.45	2	215.45			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este informe es un resumen de los datos de los estados financieros y no debe ser utilizado para fines de auditoría o de otros propósitos legales. Toda información adicional debe consultarse en los estados financieros completos.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**1er Trimestre 2024**

Fecha de elaboración: 06/04/2024



Porcentaje de avance  
**0.00%**

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Presupuesto

1


Nombre de la obra:

**Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

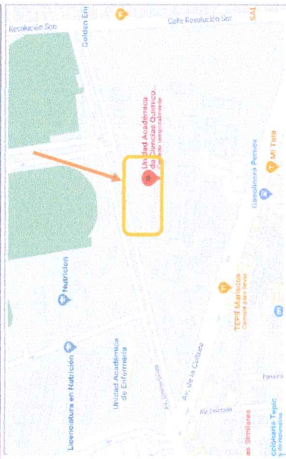

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

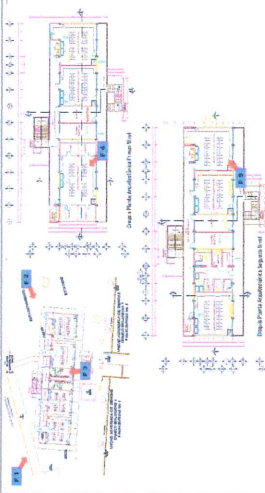


Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

FOTOS



Fotografía 1 (F1)

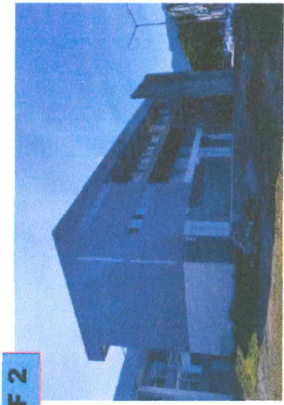


Fotografía 2 (F2)




Fotografía 3 (F3)

Observaciones:

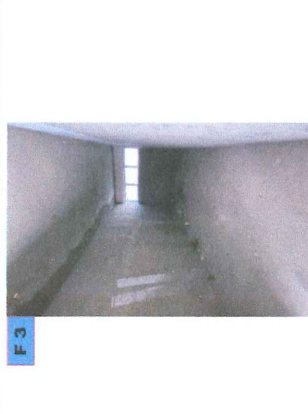

Fotografía 4 (F4)

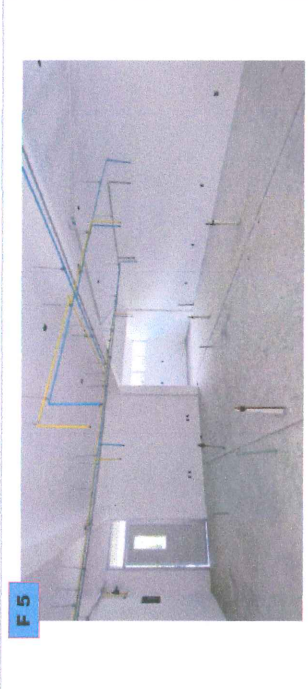

Fotografía 5 (F5)

Arq. Stephany Guzmán  
Directora de Obras  
Universitarias

M.S.P. Erick Barragán  
Secretario de Planeación,  
Administración y Finanzas

Dra. Norma Lilliana García  
Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

ERARIO FISCAL EN EL QUE  
OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**1er Trimestre 2024**

Fecha de elaboración: 09/04/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Proyecto: **2**

Nombre de la obra:


**Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa cimentación y albanilería del módulo principal y cimentación del auditorio)**

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS**



Porcentaje de avance

**0.00%**



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N. COL. CENTRO C.P. 6300,  
TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes

FOTOS



F1

Fotografía 1 (F1)



F2



F3

Fotografía 2 (F2) y Fotografía 3 (F3)



F4

Fotografía 4 (F4)



F5

Fotografía 5 (F5)



F6

Fotografía 6 (F6)

Observaciones:

Dr. Stephany Osorio  
Directora de Obra  
Unidad Académica de Artes

M.S.P. Erick Blarín  
Secretario de Obra  
Unidad Académica de Artes e Infraestructura

Dr. Norma Ulises Chávez Méndez  
Rector

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pesetaña, se podrán copiar tantas pesetañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

SERVICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**1er Trimestre 2024**

Fecha de elaboración: 09/04/2024





Porcentaje de avance  
**0.00%**

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Proyecto: **3**

Nombre de la obra: **Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotea) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia**

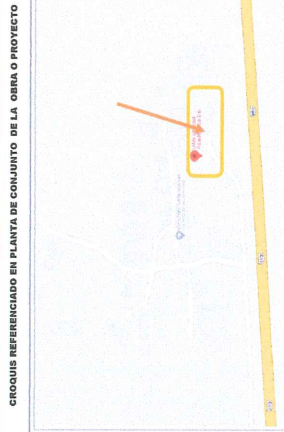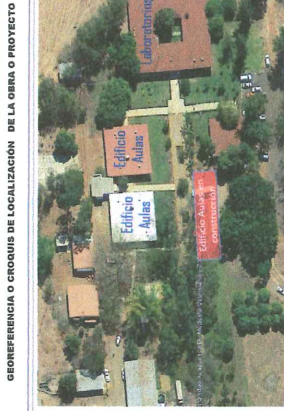

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapilla Km. 3.5 no. name, 63700 Compostela, Nay. Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

FOTOS



Fotografía 1 (F1)




Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones:

Dr. Stephany Guzmán  
Directora de Obra



M.S.P. Erico Ezequiel Jiménez  
Secretario de Planeación,  
Organización e Infraestructura

Dr. Norma Lilliana Oliván Ríos  
Rectora






NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

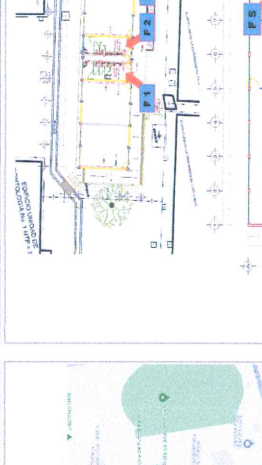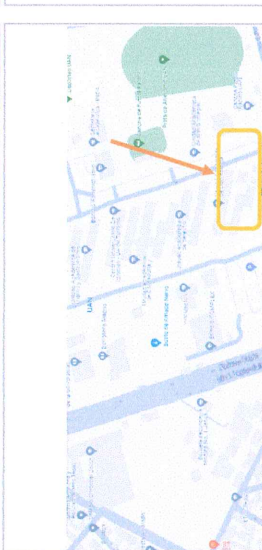REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>PRIORIDAD</p> <p><b>4</b></p>	<p>Nombre de la obra:</p> <p><b>Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelerías y obra exterior)</b></p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>
	
<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>	<p>Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPEC, NAYARIT. Biblioteca Magna Planta Baja</p>

FOTOS

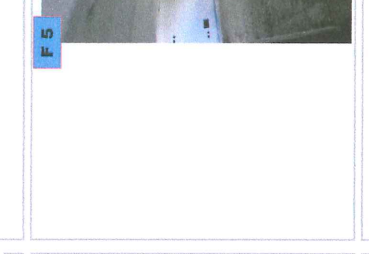 <p><b>F 1</b></p>	 <p><b>F 2</b></p>	<p>Observaciones :</p>	 <p><b>F 3</b></p>
 <p><b>F 4</b></p>	 <p><b>F 5</b></p>	<p>Fotografía 1 (F1)</p>	<p>Fotografía 2 (F2)</p>
<p>Fotografía 3 (F3)</p>	<p>Fotografía 4 (F4)</p>	<p>Fotografía 5 (F5)</p>	

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
OTORNO EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**1er Trimestre 2024**

Fecha de elaboración: 09/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD

4

Nombre de la obra:

**Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelerías y obra exterior)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

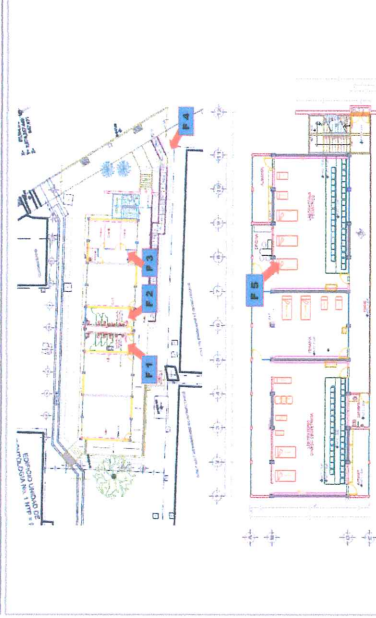

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPEC, NAYARIT. Biblioteca Magna  
Planta Baja

Arq. Stephany Guadalupe González  
Directora de Obra  
Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Guevara  
Planificación, Programación e Infraestructura  
Secretario de

Dr. Norma Lilliana Galván Ibarra  
Rectora

Porcentaje de avance

**0.00%**

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
