



S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
18 DIC 2019
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
e/i ed

UAN/UDI/01-498/2019

Tepec, Nayarit; 08 de noviembre del 2019.

Asunto: Remisión de Informe mensual

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del informe mensual de avances de obra, apoyadas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) correspondiente al corte 31 de octubre del 2019.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura física del FAM ejercicio fiscal 2019, en PDF y formato Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin otro en particular, agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración. Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

[Firma]
M.E.G.C. Aldo Asunción Zea Verdín
Director de la Unidad de Desarrollo Institucional



C.c.p. Archivo



2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre_19

FECHA DE CORTE: 31/10/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa: Nayarit

Clave Inst 911: 18MSU0019M

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Aldo Asunción Zea Verdín
Cargo: Director de la Unidad de Desarrollo Institucional
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
Correo electrónico: aldozea.uan@gmail.com

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
Cargo: Director de Obra Universitaria
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuación	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustanciable	Espacio/equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción
2	Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura	x				\$ 10,252,240.00	\$ 4,958,911.58	\$ 5,293,328.42	Aulas	11	722.00	Se ha avanzado en la construcción. Se realizó el pago de la estimación 1 y estimación 2.	Continuar con los avances físicos y financieros, hasta lograr la conclusión de la obra.	45%	15/07/19	31/12/19							
									Sanitarios	2	54.00												
									Áreas comunes	3	95.18												
									Otros	2	200.24												
									TOTAL	18	1071.42												
3	Red de Bebederos en el Campus Central	x				\$ 484,622.54	\$ 103,871.27	\$ 380,751.27				Se ha avanzado en la construcción y se realizó el pago de la factura no. 41.	Continuar con los avances físicos y financieros, hasta lograr la conclusión de la obra.	85%	30/09/19	29/10/19							
									Otros	5													
									TOTAL	5	0.00												
						\$10,736,862.54	\$5,062,782.85	\$5,674,079.69															

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Ara. Ernesto Navarrete Méndez

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
octubre_2019
FECHA DE CORTE: 31/10/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


45%

2 Nombre de la obra: **Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

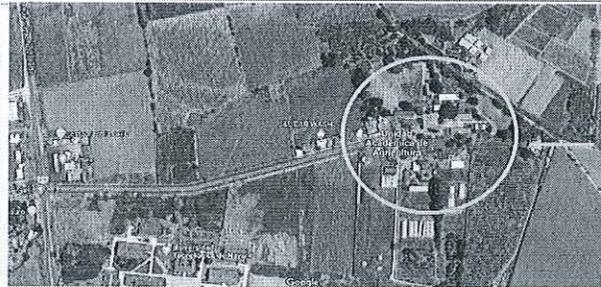


ÁREA DE ATENCIÓN

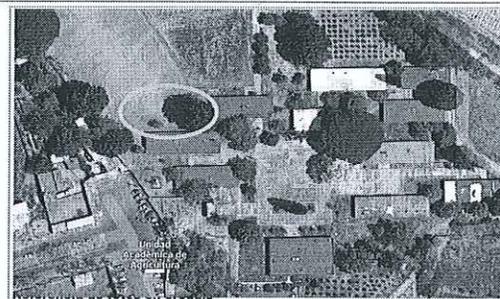


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

PUERTO VALLARTA-TEPIC COMPOSTELA, KM 9,
63780, XALISCO, NAYARIT.

FOTOS

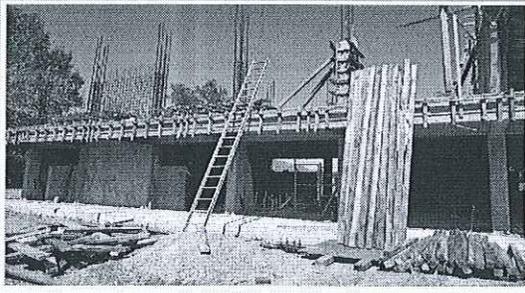


F1: Fachada principal

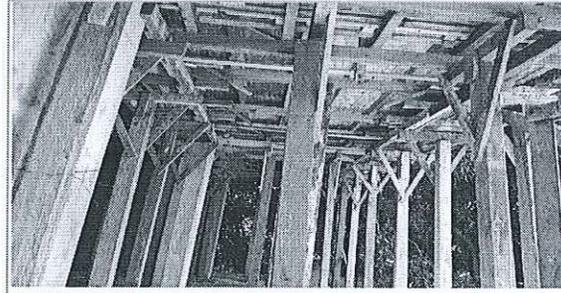

F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


Se muestra el trabajo con albañilería y acabados en planta baja y con la cimbra y colado de estructura en planta alta.

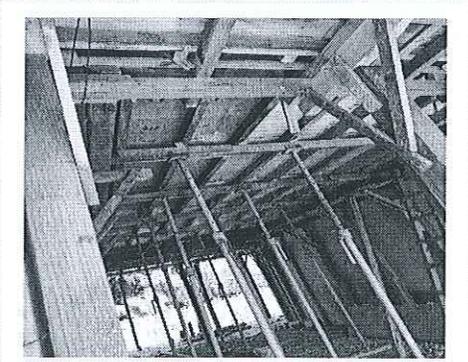

F3: Fachada posterior



F4: Entrada

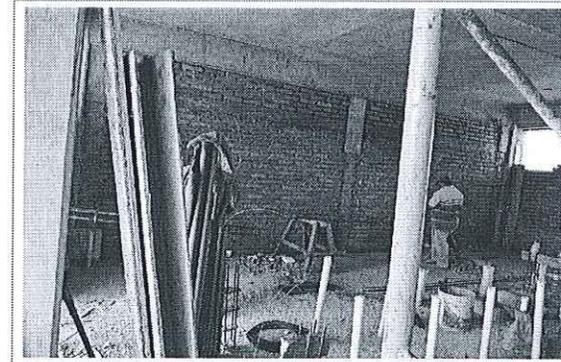

F5: Interior de aula

J.I.

W. Jorge Ignacio Peña González

Art. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre_2019

FECHA DE CORTE: 31/10/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


85%

PRIOIDAD

3

Nombre de la obra: **Red de Bebederos en el Campus Central**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

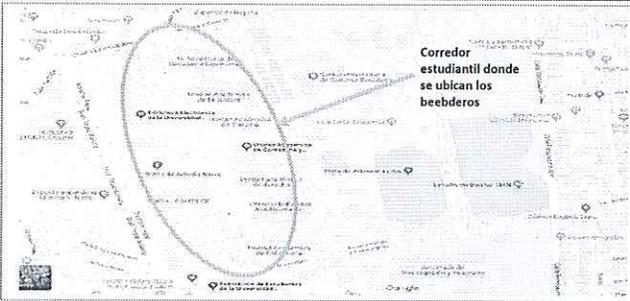

Corredor estudiantil donde se ubican los bebederos




Puntos aproximados donde se colorarán los bebederos


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000

FOTOS

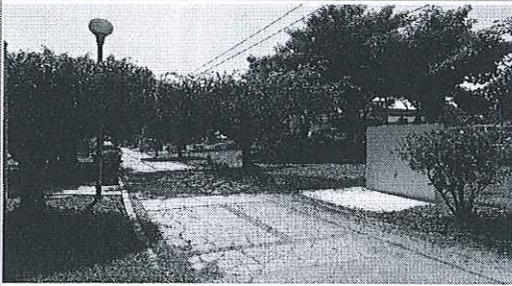


F1: Preparación de espacio para colocación de bebedero

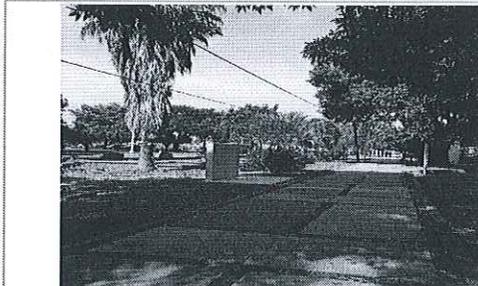


F2: Preparación de espacio para colocación de bebedero

Comentarios de los trabajos realizados:


Se concluyó con la instalación hidrosanitaria y con los muretes y planchas donde se colocarán los bebederos; se trabaja en la herrería para las cubiertas.

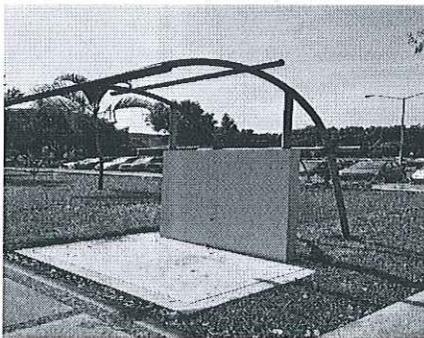

F3: Preparación de espacio para colocación de bebedero

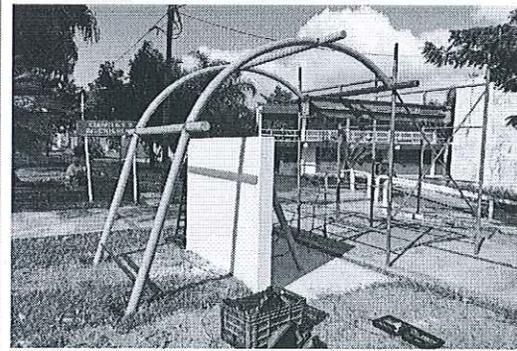

F4: Preparación de espacio para colocación de bebedero

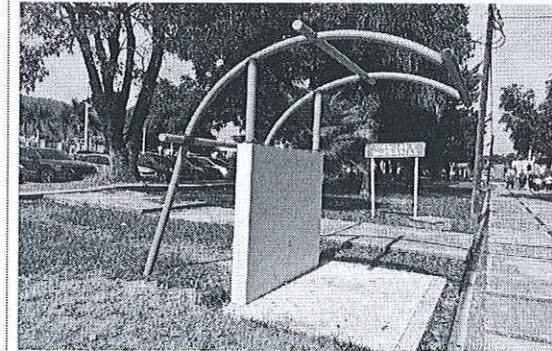

F5: Preparación de espacio para colocación de bebedero

M.C. Jorge Ignacio Peña González

M.C. Jorge Ignacio Peña González

Ald. Ernesto Navarrete Méndez

Ald. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
