

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre_19

FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
 Entidad federativa: Nayarit
 Clave Inst 911: 18MSU0019M

Nombre: Aldo Asunción Zea Verdín
 Cargo: Director de la Unidad de Desarrollo Institucional
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
 Correo electrónico: aldozea.uan@gmail.com

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
 Cargo: Director de Obra Universitaria
 Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
 Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obra de continuidad	Equipamiento	Asignaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/ equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
2	Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura	x			\$ 10,252,240.00	\$ 2,912,791.78	\$ 7,339,448.22	Aulas	11	722.00	Para el arranque de la construcción se pagó el 30% del monto total al contrato, que corresponde al anticipo. Se está gestionando el pago de la estimación ¹ para el mes de Octubre 2019.	Dar continuidad a los avances físicos y financieros, hasta lograr la conclusión de la obra.	33%	GLOBAL DEL PROYECTO									
								Sanitarios	2	54.00				15/07/19	31/12/19								
								Áreas comunes	3	95.18													
								Otros	2	200.24													
								TOTAL	18	1071.42													
3	Red de Bebederos en el Campus Central	x			\$ 484,622.54	\$ -	\$ 484,622.54				Se cuenta con el acta de fallo de la construcción de los bebederos en el andador universitario de la UAN campus Tepic, con fecha 23 de Septiembre de 2019.	0%	GLOBAL DEL PROYECTO										
								TOTAL	0	0.00													
					\$10,736,862.54	\$2,912,791.78	\$7,824,070.76																

M.C. José Gil Peña González

Ernesto Navarrete Méndez

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar hasta tres como sea necesario.
 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, siempre que se vean reflejados en el reporte fotográfico.
 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado


septiembre 2019

FECHA DE CORTE: 30/09/2019


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

2 Nombre de la obra: Edificio de aulas (dos niveles) Unidad Académica de Agricultura

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

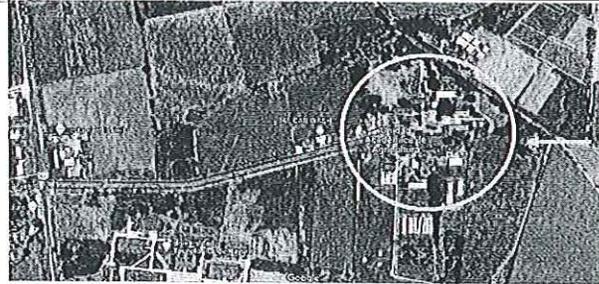

ÁREA DE ATENCIÓN

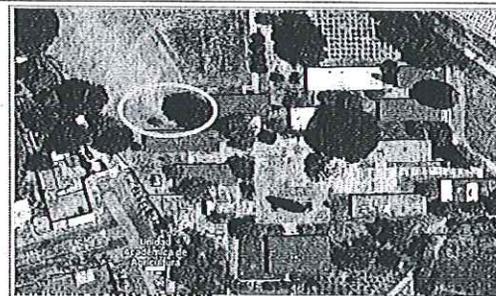

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


PUERTO VALLARTA-TEPIC COMPOSTELA, KM 9,
63780, XALISCO, NAYARIT.




Porcentaje de avance

33%

Fotografías

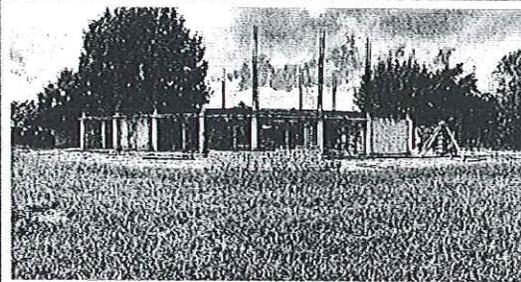


F1: Fachada principal

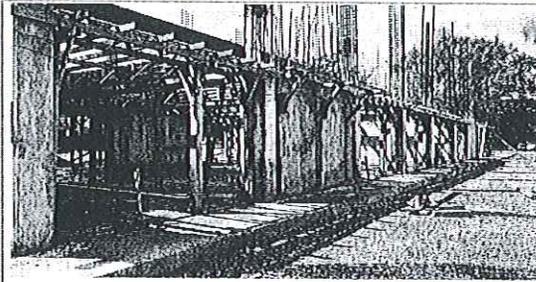


F2: lateral

Comentarios de los trabajos realizados:


En las fotografías se muestran cimbrado armado y colado de muros de concreto de la planta baja; y cimbrado armado y colado de columnas y cimbrado de traves y losa de 7 entre-ejes.

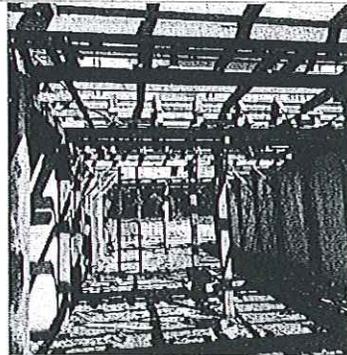

F3: Fachada posterior

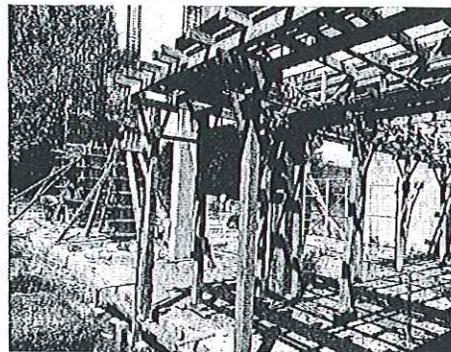

F4: Entrada

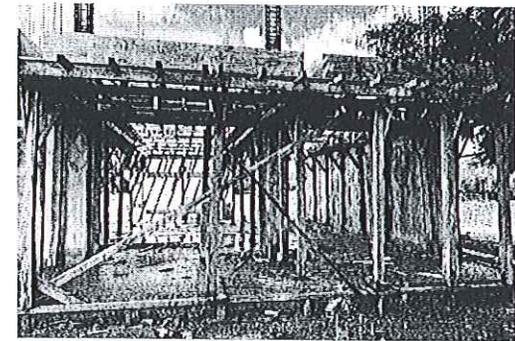

F5: Interior de aula

M.C. José Gabo Peña González

Arq. Ernesto Navarrete Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
septiembre_2019
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

10%

3 Nombre de la obra: **Red de Bebederos en el Campus Central**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

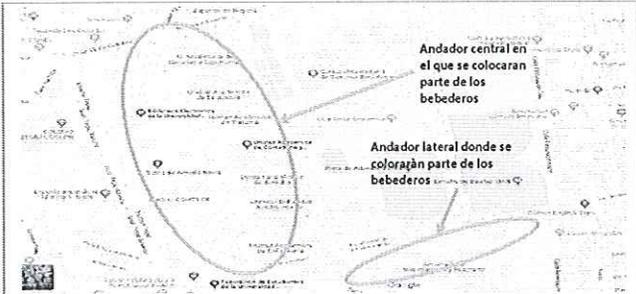


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CD. DE LA CULTURA S/N, COL. CENTRO, C.P. 63000

FOTOS

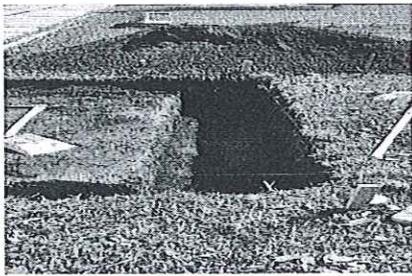


F1: Preparación de espacio para colocación de bebedero

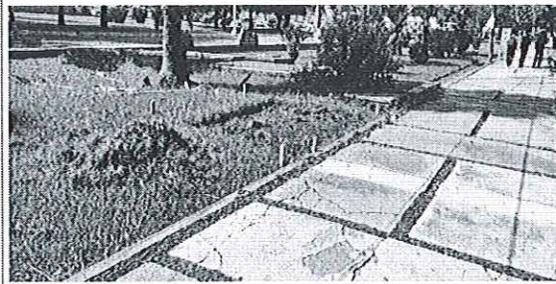

F2: Preparación de espacio para colocación de bebedero

Comentarios de los trabajos realizados:


En las imágenes se muestran los inicios de la obra. Se preparan los espacios donde se colorarán los bebederos, ubicados a lo largo de un andador que atraviesa el campus Tepic de la UAN.

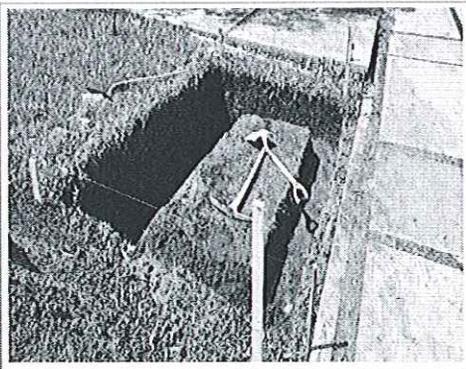

F3: Preparación de espacio para colocación de bebedero



F4: Preparación de espacio para colocación de bebedero

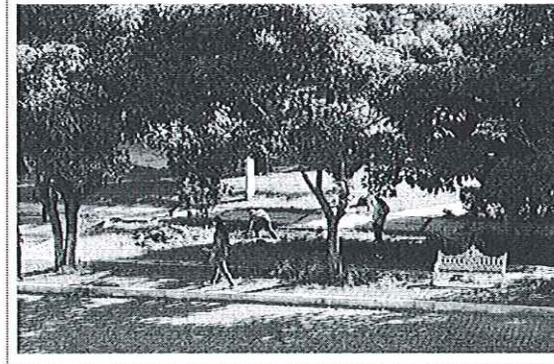

F5: Preparación de espacio para colocación de bebedero

Arq. Jorge Ignacio Peña González

Arq. Ernesto Lasarre Méndez

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
